

HIGHLIGHT

70 zu 700 Tonnen



Teleskopkran 700 t setzt 70 Tonnen schweren Abfangträger ab - Zentimeterarbeit für den Kranführer. Nur eine kleine Handbewegung am Steuerjoystick, und schon setzt sich der 70 Tonnen schwere Koloss aus Stahlbeton in Bewegung. Am Kranhaken hängt ein Sonderbauteil das später zur Abfangung einer neuen Geschossdecke über einem Bestandsgebäude dienen soll.

Alles geht sehr langsam, wie ein überdimensionaler Bauklotz hängt das 22,50 Meter lange und 3,40 Meter hohe Betonsegment am Himmel. Die Wetterbedingungen sind zu diesem Zeitpunkt gut, kein Lüftchen regt sich, so dass der 70 Tonnen schwere Träger zentimetergenau auf die neuen Stützen abgesetzt werden kann.



Bereits 2 Tage vor der eigentlichen Montage wurde der Mobil-Teleskopkran mit einer Tragkraft von 700 Tonnen direkt neben dem Montageort aufgebaut. Insgesamt sieben Tieflader schafften Gegengewichte und weitere Kranteile heran.

Der Abfangträger wurde bei uns im Fertigteilwerk, in der Industriestraße in Bielefeld, gefertigt. Wir haben die Produktion, den Transport und die Montage übernommen. Dabei wurden wir unterstützt durch die Universal Transport Michels GmbH & Co. KG aus Paderborn und die Franz Bracht Kran-Vermietung GmbH aus Erwitte.



Spenner System GmbH
Betriebsstätte Hamm:
Betriebsstätte Niederkassel:
Betriebsstätte Hamburg:

Industriestraße 43 // 33689 Bielefeld // Tel +49 5205 9103-0 // Fax +49 5205 9103 49
Ostring 8 // 59065 Hamm // Tel +49 2381 30566-99 // Fax +49 2381 30566 53
Karl-Hass-Str. 21 // 53859 Niederkassel // Tel +49 221 571647-05 // Fax +49 221 571647-06
Marktstraße 57 // 20357 Hamburg // Tel +49 40 414945-85 // Fax + 49 40 414945-86

HIGHLIGHT

70 zu 700 Tonnen

Technische Daten

Stahlbetonfertigteile Abfangträger:

L/B/H: 22,50 m / 3,40 m / 0,35 – 1,00 m

Gewicht: 70 Tonnen

davon Bewehrung: 6 Tonnen

Spezial-Fahrzeug:

4-Achs-Zugmaschine (560 PS)
mit 8-Achs-Teleskopsattel

Gesamtachsen: 12

Gesamtabmessungen

L/B/H: 30,00 m / 2,80 m / 4,20 m

Gesamtgewicht 110 Tonnen

Mobil-Teleskopkran mit SSL:


Maximale Traglast: 700 Tonnen

Auslegerlänge: 60 m

Maximale Höhe: 145,50 m

Gesamtballast/Gegengewicht: 160 t

Sattelzüge für Ballasttransport: 7

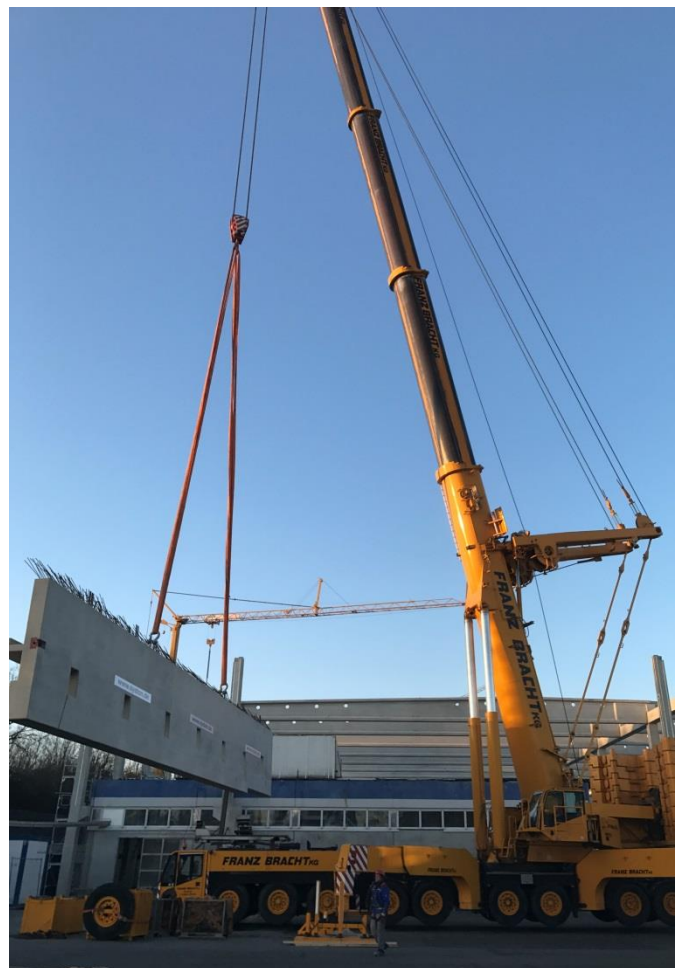

Spenner System GmbH
Betriebsstätte Hamm:
Betriebsstätte Niederkassel:
Betriebsstätte Hamburg:

Industriestraße 43 // 33689 Bielefeld // Tel +49 5205 9103-0 // Fax +49 5205 9103 49
Ostring 8 // 59065 Hamm // Tel +49 2381 30566-99 // Fax +49 2381 30566 53
Karl-Hass-Str. 21 // 53859 Niederkassel // Tel +49 221 571647-05 // Fax +49 221 571647-06
Marktstraße 57 // 20357 Hamburg // Tel +49 40 414945-85 // Fax + 49 40 414945-86
